

Suivi de projet Scrum -- PrevisionEnergie

Organisation Scrum

| Element | Valeur | |-----|-----| | **Duree de sprint** | 2 semaines | | **Rituels** | Daily standup (15 min), Sprint planning, Sprint review, Retrospective | | **Outil de suivi** | Trello / Jira (board Kanban avec colonnes : Backlog, To Do, In Progress, Review, Done) | | **Estimation** | Poker planning (suite de Fibonacci : 1, 2, 3, 5, 8, 13) | | **Indicateurs** | Velocity, Burndown chart, taux de completion |

Backlog et Sprints

Sprint 0 -- Cadrage (Semaines 1-2)

Objectif : Analyser le besoin, cadrer le projet, planifier

| User Story | Points | Statut | |-----|-----|-----| | Conduire les entretiens (Direction, DSI, DPO, Service donnees) | 3 | Done | | Rediger la note de synthese (5 parties) | 5 | Done | | Cartographier les sources de donnees (4 dimensions) | 3 | Done | | Produire l'etude technique d'architecture | 8 | Done | | Planifier la feuille de route (sprints, jalons) | 3 | Done |

Velocity : 22 points | **Completion** : 100%

Sprint 1 -- Ingestion Bronze (Semaines 3-4)

Objectif : Pipeline d'extraction multi-sources operationnel

| User Story | Points | Statut | |-----|-----|-----| | Implementer KaggleExtractor (CSV) | 3 | Done | | Implementer RTEExtractor (API REST) | 5 | Done | | Implementer MeteoFranceExtractor (API) | 5 | Done | | Implementer DataGouvExtractor (API) | 3 | Done | | Creer l'abstraction StorageBackend (local + GCS) | 5 | Done | | Ecrire les tests unitaires ingestion | 3 | Done | | Versionner sur Git + documentation | 2 | Done |

Velocity : 26 points | **Completion** : 100%

Sprint 2 -- Transformation Silver (Semaines 5-6)

Objectif : Pipeline Bronze -> Silver complet avec qualite

| User Story | Points | Statut | |-----|-----|-----| | Pipeline de nettoyage (typage, normalisation, deduplication) | 8 | Done | | Imputation des valeurs manquantes | 3 | Done | | Detection et traitement des outliers (IQR) | 3 | Done | | Calcul DJU (Degree-Day Units) | 3 | Done | | Calendar features (weekend, mois, jour semaine) | 2 | Done | | Quality reports JSON par fichier | 3 | Done | | Tests unitaires processing | 5 | Done |

Velocity : 27 points | **Completion** : 100%

Sprint 3 -- DWH Gold + API (Semaines 7-8)

Objectif : Entrepot de donnees en etoile + API REST

| User Story | Points | Statut | |-----|-----|-----| | DDL schema en etoile (1 fait + 4 dimensions) | 5 | Done | | ETL Silver -> Gold (MERGE upsert idempotent) | 8 | Done | | SCD Type 2 sur dim_region | 5 | Done | | API FastAPI avec 5 routers | 8 | Done | | Authentification Bearer token | 3 | Done | | Tests integration API + ETL | 5 | Done | | Documentation OpenAPI + API contract | 2 | Done |

Velocity : 36 points | **Completion** : 100%

Sprint 4 -- Data Lake et Gouvernance (Semaines 9-10)

Objectif : Formaliser le Data Lake, RBAC, lifecycle, catalogue

| User Story | Points | Statut | |-----|-----|-----| | Architecture Data Lake 3 zones (Raw/Curated/Consumption) | 3 | Done | | RBAC 3 roles (reader/engineer/admin) | 3 | Done | | Politique de retention par zone | 2 | Done | | Pack metadata Apache Atlas (glossaire, entities, lignage) | 8 | Done | | DAG Airflow batch quotidien | 5 | Done | | Comparaison catalogues (Atlas vs Glue vs Dataplex) | 3 | Done | | Delta Lake DDL (cible de deployment) | 3 | Done | | Tests RBAC + lifecycle | 3 | Done |

Velocity : 30 points | **Completion** : 100%

Sprint 5 -- Finalisation et Soutenance (Semaines 11-12)

Objectif : Documentation, tests finaux, preparation soutenance

| User Story | Points | Statut | |-----|-----|-----| | Rapports professionnels E2-E7 | 13 | Done | | Registre RGPD formel | 2 | Done | | Document de veille technologique | 3 | Done | | Plan de communication multi-interlocuteurs | 2 | Done | | Presentation PowerPoint finale | 5 | Done | | Demo setup script (run_demo_setup.py) | 3 | Done | | Revue de code et audit | 3 | Done |

Velocity : 31 points | **Completion** : 100%


Indicateurs d'avancement

Velocity par sprint

```
Sprint 0 : ..... 22 pts
Sprint 1 : ..... 26 pts
Sprint 2 : ..... 27 pts
Sprint 3 : ..... 36 pts
Sprint 4 : ..... 30 pts
Sprint 5 : ..... 31 pts
```

Velocity moyenne : 28.7 points / sprint

Burndown chart (Sprint 3 -- exemple)

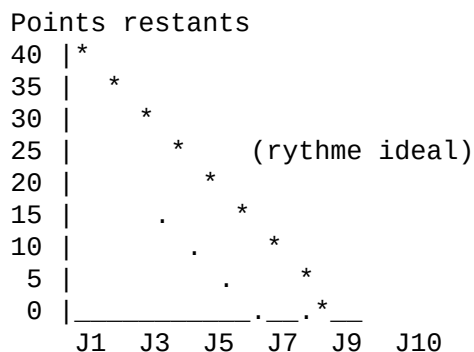

* = ideal . = reel (leger retard rattrape en fin de sprint)

Taux de completion global

Metrique Valeur	----- -----	User stories totales 47	User stories completees 47	Points totaux 172	
Points livres 172		Taux de completion	100%		

Gestion des risques rencontres

Sprint Risque Impact Resolution	----- ----- ----- -----	Sprint 1 API RTE indisponible temporairement Moyen Fallback sur donnees Kaggle, retry avec backoff	Sprint 2 Donnees meteo avec beaucoup de valeurs manquantes Faible Imputation par mediane regionale implementee	Sprint 3 Complexite du SCD2 sous-estimee Moyen Reestimation de 3 a 5 points, livree dans le sprint	Sprint 4 Atlas necessite une infra lourde pour demo Faible Export JSON simulant l'integration (atlas_bundle.json)
---------------------------------------	-------------------------	--	--	--	---
